
2026

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SERTIFIKASI
INSTALASI PENYALUR PETIR

Perusahaan	**: PT Coca - Cola Bottling Indonesia**
Item No	**: K3 DC IPP 107**
Jenis	**: IPP / Konvensional**
SN	**: -**
Lokasi	**: Area IPP Pengisian**
Inspected	**: 05 Juni 2026**
Re – Inspection	**: 05 Juni 2028**

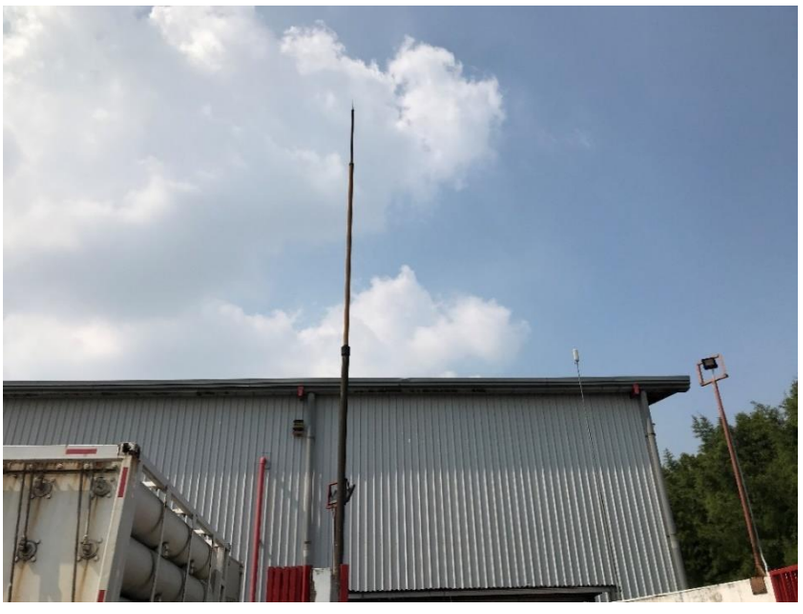

PT. UPAYA RIKSA DAYA
Jl. Pondasi No. 50B Kampung Ambon,Jakarta Timur. 13210
Phone: 021 4891409 | 021 4715699,021 47861912
Email : urd@upayariksadaya.com **Wab. upayariksa.com**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PERTAMA
JENIS PERALATAN : INSTALASI PENYALUR PETIR
No. Reg : 555/INSP-IPP/PJK3-URD/VI/2026

Berdasarkan Permohonan **PT. COCA – COLA BOTTLING INDONESIA** ke **PJK3 PT. Upaya Riksa Daya**, pada **Tanggal 05 Juni 2026**, perihal pemeriksaan dan pengujian **Pertama Instalasi Penyalur Petir** yang terpasang di **Area IPP Pengisian. PT. COCA – COLA BOTTLING INDONESIA,** Maka dibuatkan laporan Pemeriksaan dan Pengujian sebagai berikut :

NAMA PEMILIK / GEDUNG : **PT. COCA – COLA BOTTLING INDONESIA**
ALAMAT : **Jl. Teuku Umar KM.46, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat**
JENIS PERALATAN : **INSTALASI PENYALUR PETIR**
JENIS RIKSA / UJI : **Pertama**
TANGGAL RIKSA / UJI : **05 Juni 2026**

No.	URAIAN	KETERANGAN
1	Jenis / Type	Konvensional
2	Item no	-
2	Nomor Seri	-
3	Asal Negara Pembuat	-
4	Jumlah Alat	1 Buah
5	Tinggi Tiang	6 meter
6	Jumlah hantaran penyalur	1 Buah
7	Sambungan ukur (joint test)	1 buah
8	Luas penampang hantaran penyalur	BC 50 mm^2
9	Jumlah elektroda tanah	1 buah
10	Tahanan Sebaran	1,18 Ω (Ohm)
11	Luas Bangunan	± -m^2
12	Tinggi Bangunan	± - m
13	Radius Proteksi	- meter
14	Nomor Ijin Pemakian	-
15	Tanggal Pemeriksaan	05 Juni 2026
16	Diperiksa Oleh	PT. Upaya Riksa Daya

I. PEMERIKSAAN DOKUMEN

A. Gambar Instalasi Penyalur Petir
   - SLD : ~~Ada~~ / Tidak
   - Gambar Situasi : Ada / ~~Tidak~~
   - Gambar Rencana : Ada / ~~Tidak~~
   - Gambar Detail Dgn Keterangan : Ada / ~~Tidak~~

B. Spesifikasi : Ada / ~~Tidak~~
C. Laporan Pengujian Instalasi : Ada / ~~Tidak~~
D. Laporan Inspeksi Terdahulu : Ada / ~~Tidak~~
E. Laporan Perbaikan Terdahulu : Ada/ ~~Tidak~~
F. Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir : Ada / ~~Tidak~~
G. Lain-lain : Ada / ~~Tidak~~

II. ALAT UKUR

A. Merk Alat Ukur : KYORITSU Digital Earth Tester Model 4105A
B. Metode Pengukuran : GARIS LURUS

III. HASIL INSPEKSI VISUAL

AIR TERMINAL

1. JENIS AIR TERMINAL : **Konvensional**
2. JARAK / RADIUS PROTEKSI : **- m**
3. TINGGI TIANG AIR TERMINAL : **6 m**
4. JUMLAH DAN JARAK : **1 buah**
5. KEAADAAN VISUAL AIR TERMINAL (BERKARAT/TIDAK) : **TIDAK**
6. GAMBAR BENTUK ATAP DAN UKURANNYA :

DOWN CONDUCTOR

1. JUMLAH DOWN CONDUCTOR : **1 (satu)**
2. LUAS PENAMPANG : **BC 50 mm²**
3. TEBAL PENAMPANG : **Ø $1x50mm^2$**
4. TINGGI BANGUNAN : **± 6 m**

EARTH ELECTRODE

1. JENIS ELETRODA BUMI (BATANG/ROD, PITA, MESH) : **Batang / Rod Tembaga**
2. DIAMETER PENAMPANG : Ø 2 mm²
3. KEDALAMAN ELEKTRODA : **12 m**
4. LUAS PENAMPANG : **50 mm^2**


ITEMS PEMERIKSAAN		HASIL			KET.
NO	KONDISI MATERIAL	BAIK	BURUK	N/A	
1	AIR TERMINAL KLEM. BAUT & PENYANGGA	√			
2	PENGHANTAR DAERAH ATAP KLEM. BAUT & PENYANGGA	√			
3	PENGHANTAR TURUN KE TANAH KLEM. BAUT & PENYANGGA	√			
4	KOTAK HUBUNG / BAK KONTROL KLEM. BAUT		√		Tidak ada box kontrol
5	AKAR / BATANG PEMBUMIAN KLEM, BAUT	√			
6	PENGHANTAR AKAR KE AKAR	√			

IV. KONDISI PEMASANGAN SAMBUNGAN

ITEMS PEMERIKSAAN		HASIL			KET.
NO	KONDISI MATERIAL	BAIK	BURUK	N/A	
1	SAMBUNGAN KEPALA AIR TERMINAL	√			
2	KLEM, BAUT & PENYANGGA	√			
3	SAMBUNGAN HANTARAN PENURUNAN (DOWN CONDUCTOR) KE KEPALA PENANGKAL	√			
4	SAMBUNGAN HANTARAN PENURUNAN (DOWN CONDUCTOR) KE HANTARAN	√			
5	SAMBUNGAN HANTARAN PENURUNAN (DOWN CONDUCTOR) KE KOTAK HUBUNG (BAK KONTROL)	√			
6	SAMBUNGAN HANTARAN PENURUNAN (DOWN CONDUCTOR) KE PEMBUMIAN	√			

V. PEMERIKSAAN UMUM					
ITEMS PEMERIKSAAN		**HASIL**			**KET.**
NO	KONDISI MATERIAL	BAIK	BURUK	N/A	
1	SISTEM JARINGAN INSTALASI	√			**1,18 Ω**

DIAGRAM RANGKAIAN

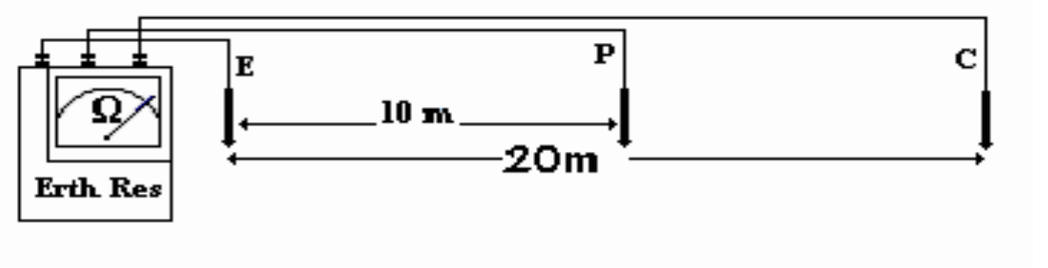

NO	E - C	E – P	NILAI R (Ω)	KET.
1	2	3	**1,18 Ω**	5

VI. HASIL PENGUJIAN					
ITEMS PEMERIKSAAN		**HASIL**		**HASIL PENGUKURAN**	**KET.**
NO	**KONDISI MATERIAL**	**BAIK**	**BURUK**		
1	PENGUJIAN TAHANAN PEMBUMIAN	√		**R = 1,18 Ω**	**Standar < 5 Ω**

VII. KESIMPULAN DAN SYARAT :

Dari hasil pemeriksaan dan pengukuran terhadap instalasi tersebut menggunakan alat merk **Digital Earth Tester Kyoritsu 4105 A**, maka dapat disimpulkan bahwa instalasi penyalur petir tersebut **MEMENUHI PERSYARATAN K3** digunakan di Area **IPP Pengisian, PT. COCA - COLA BOTTLING INDONESIA** dengan syarat sebagai berikut :

1. Instalasi penyalur petir harus dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh tenaga ahli di bidang instalasi penyalur petir, serta dilakukan pelumasan secara berkala menggunakan grease untuk mencegah terjadinya karat
2. Harus dilakukan perawatan pada Rod minimal 1 kali dalam 6 bulan guna memastikan kondisi dan fungsi sistem pembumian tetap optimal
3. Berikan box kontrol pada unit instalasi penyalur petir
4. Apabila terdapat indikasi atau kecurigaan terhadap kondisi fisik instalasi, maka petugas yang di tunjuk (teknisi pemeliharaan) agar segera melaporkan kondisi tersebut kepada pihak pengelola atau pemilik gedung untuk di tindaklanjuti
5. Paling lambat tanggal **05 Juni 2028** Instalasi Penyalur Petir tersebut harus dilakukan pemeriksaan berkala oleh Ahli K3 Instalasi Listrik atau Pengawas Spesialis, sesuai dengan ketentuan dan standar keselamatan yang berlaku

DIPERIKSA OLEH
AHLI K3 LISTRIK



Asep Hermawan
5/18289/AS.01.04/XI/2025

VIII. DOKUMENTASI

Tiang Air Terminal	**Uji Resistensi**
	
Uji Resistensi	**Uji Resistensi**
	
Uji Resistensi	**Hasil Resistensi 1,18 Ohm**
	

Stiker Riksa Uji



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : http://www.naker.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 1444 /AS.01.02/XII/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi, syarat teknis, dan laporan kegiatan laporan kegiatan PT Upaya Riksa Daya oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari PT Upaya Riksa Daya Nomor : 037/URD/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Listrik Nomor 5/14259/AS.01.04/VII/2024 a.n Agus Supriyanto;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2310230099041;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 19011965;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 13210.20241030.0001, tanggal 30 Oktober 2024;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 76.651.453.3-003.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan	: **PT UPAYA RIKSA DAYA**
Alamat	: Jl Pondasi No 50B, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur
Penanggung Jawab	: Mudjachid Machmud
Tenaga Ahli	: Agus Supriyanto
Bidang Kegiatan	: Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir

KEDUA : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2024

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Hery Sutanto, S.T., M.M.
197110822 199703 1 002

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 18289 / AS.01.04 / XI / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **ASEP HERMAWAN,** maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukkan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Ment eri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor Kep. 47/PPK&K3/VIII/2015 tentang Pembinaan Calon Ahli Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik.

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Pimpinan PT UPAYA RIKSA DAYA Nomor 7020/URP/VIII/2025 Tanggal 07 Agustus 2025 perihal Permohonan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Listrik Nomor 5/43/AS.01.04/XI/2025 tanggal 03 November 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik kepada:**

Nama	:	**ASEP HERMAWAN**
Tempat, Tanggal Lahir	:	MAJALENGKA, 16-06-1992
Perusahaan	:	PT UPAYA RIKSA DAYA
Alamat	:	JL.PONDASI NO 50B KAMPUNG AMBON, JAKARTA TIMUR

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 November 2025

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Ir. Ismail Pakaya, M.E
NIP. 19680113 199303 1 005

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
Jl. Husni Hamid No. 55.A, Nagasari, Karawang Barat
e-mail : bppkwilayah2@gmail.com
Karawang – 41311

SURAT KETERANGAN

Nomor: 566.8/2831/UPTD-WIL.II/VII/2026

Berdasarkan pemeriksaan/pengujian yang telah dilakukan sepenuhnya oleh Ahli K3 Listrik ASEP HERMAWAN SKP No. 5/18289/AS.01.04/XI/2025 dari PJK3 **PT UPAYA RIKSA DAYA** yang beralamat : Jl. Pondasi No 50B, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, pada tanggal 05 Juni 2026 mengenai INSTALASI PENYALUR PETIR di **PT Coca - Cola Bottling Indonesia** dan sesuai laporan pemeriksaan dan pengujian Nomor : 555/INSP-IPP/PJK3-URD/VI/2026, di terangkan bahwa:

A. Data Umum Objek Pengujian

1. Jenis Objek K3 yang diuji	:	INSTALASI PENYALUR PETIR
2. Nama Perusahaan	:	PT Coca - Cola Bottling Indonesia
3. Alamat Perusahaan	:	Jl.Teuku Umar KM.46, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat
4. Lokasi	:	Area IPP Pengisian. PT. COCA – COLA BOTTLING INDONESIA

B. Data Teknis Objek Pengujian

1. Jenis Penyalur Petir	:	Konvensional
2. Hasil Pengujian Tahanan	:	1,18 Ω (Ohm)
3. Bentuk Elektroda	:	copper rod
4. Jenis Penghantar	:	BC 50 mm2
5. Tinggi Tiang Penyalur	:	6 meter
6. Tinggi Bangunan	:	± - m
7. Radius Proteksi	:	- meter
8. Jumlah Kontrol Box	:	1 buah

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui:
Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah II

PONCO WIDODO, S.P., M.A.P.
Pembina
NIP. 19680824 199803 1 006

Scan untuk verifikasi

Karawang, 20 Juli 2026
Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik

YADI MULYADI ST
NIP. 19791129 201101 1 001
SKP.KEP. 154/NAKER-BINWASK3/VII/2017

Proses pelayanan penerbitan Surat Keterangan ini tidak dikenakan biaya
