2026

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SERTIFIKASI BEJANA TEKAN & TANGKI TIMBUN

Perusahaan	**: PT Coca - Cola Bottling Indonesia**
Item No	**: K3 BTU 001**
Jenis	**: PUBT / Bejana Tekan (Air Pressure Tank)**
SN	**: TMH-3013-21**
Lokasi	**: Area Compressor Room, Bekasi I Plant**
Inspected	**: 06 Juli 2026**
Re – Inspection	**: 06 Juli 2028**



PT. UPAYA RIKSA DAYA
Jl. Pondasi No. 50B Kampung Ambon,Jakarta Timur. 13210
Phone: 021 4891409 | 021 4715699,021 47861912
Email : urd@upayariksadaya.com Web. upayariksa.com

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
BEJANA TEKAN (AIR PRESSURE TANK)
PT COCA - COLA BOTTLING INDONESIA
No. 1525/INSP-PUBT/PJK3-URD/VII/2026

I. DATA UMUM

1.	Pemilik	: PT. COCA - COLA BOTTLING INDONESIA
2.	Alamat	: Jl. Teuku Umar KM 46, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat
3.	Pemakai	: PT. COCA – COLA BOTTLING INDONESIA
4.	Lokasi Unit	: Area Compressor Room, Bekasi I Plant
5.	Nama Operator	: -
6.	Jenis Bejana	: Air Pressure Tank
7.	Pabrik Pembuat	: Indonesia / Jawa Barat
8.	Merk / Type	: Silinder Tegak
9.	Tahun Pembuatan	: 2021
10.	Item No	: K3 BTU 001
11.	No. Serie / No. Unit	: TMH - 3013 – 21
12.	Tekanan Design	: 11 Kg/ Cm2
13.	Tekanan Kerja Maks. Yang Diperbolehkan	: 10 Kg/ Cm2
14.	Kapasitas	: 3.000 Liter
15.	Dimensi	: 2260 mm x (OD) 110 mm
16.	Media yang digunakan	: Udara
17.	Temperatur Kerja	: 30^{0} C - 60^{0} C
18.	Pedoman Pemeriksaan	: Permenaker No. 37 th 2016, ASME VIII Div.1
19.	Digunakan Untuk	: Menyimpan Udara.
20.	Jenis Pemeriksaan	: Berkala
21.	No Ijin Pemakaian	: 566.2/7553/UPTD-WIL.II/IX/2024
22.	Tanggal Pemeriksaan dan Pengujian	: 06 Juli 2026
23.	Diperiksa Oleh	: PT. Upaya Riksa Daya

II. DATA TEKNIS

Shell / Badan	Jumlah RoundShell		2 (Dua)			
	Cara Penyambungan		Welding			
	Material / Bahan		17500			
	Diameter Dalam (ID)		550 mm			
	Ketebalan (t)		10 mm			
	Panjang Badan		2260 mm			
	Penguat	Jenis	n/a			
		Jumlah	n/a			
		Ukuran/Dimensi	n/a			
Tutup/Head	**Samping Kiri**	Jenis/Bentuk	Elipsoidal			
		Lengkungan (R)	405 mm			
		Lekukan (r)	76,5 mm			
		Kemiringan	n/a			
		Diameter	550 mm			
		Ketebalan	10 mm			
		Material / Bahan	17500			
	Samping Kanan	Jenis/Bentuk	Elipsoidal			
		Lengkungan (R)	550 mm			
		Lekukan (r)	76,5 mm			
		Kemiringan	n/a			
		Diameter	450 mm			
		Ketebalan	10 mm			
		Material / Bahan	17500			
Pipa-pipa / Channel	Jenis/bentuk		n/a			
		Diameter	Ketebalan	Panjang	Jumlah	
	Dimensi	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Material		n/a			
	Cara Pemasangan		n/a			
Instalasi Pipa	Diameter		n/a			
	Ketebalan		n/a			
	Jenis Katup		n/a			
	Jumlah		n/a			

III. LAPORAN PEMERIKSAAN

a). Visual

No.	Bagian - Bagian	Kondisi		Keterangan
		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1	**Komponen Bejana Tekan Meliputi :**	√		
	a. Shell/badan	√		
	b. Head/tutup ujung	√		
	c. Jacket/selubung		-	n/a
	d. Pipa-pipa/ channel	√		
	e. Nozzle/nosel	√		
2	Kelengkapan Bejana :			
	a. Pedoman tekanan	√		
	b. Pengukur temperature		-	n/a
	c. Pelat nama	√		
	d. Keran pembuang/drain	√		
	e. Keran ventilasi	√		
	f. Katup pengaman/safety valve	√		
	g. Katup pelampung	√		
	h. Katup Vakum	√		
	i. Filter		-	n/a
	j. Steam Trap		-	n/a
3	Support	√		
4	Instalasi pipa			
	a. Katup-katup	√		n/a
	b. Support	√		n/a

Keterangan : Pemeriksaan visual dilakukan terhadap kondisi sambungan keretakan, korosi, dan perubahan bentuk.

b) Dimensi

No.	Komponen	Ukuran / Dimensi	Keterangan
1	**Shell/badan**		
	a. Ketidak bulatan		
	b. Ketebalan	9,16 mm	
	c. Diameter	550 mm	
	d. Panjang	2260 mm	
2	**Head/tutup ujung**		
	a. Diameter	550 mm	
	b. Ketebalan	9,34 / 9,29 mm	
3	**Pipa-pipa/channel**		
	a. Diameter	n/a	
	b. Ketebalan	n/a	
	c. Panjang	n/a	
4	**Instalasi pipa**		
	a. Diameter	n/a	
	b. Ketebalan	n/a	
	c. Panjang	n/a	

KETERANGAN : Pemeriksaan dimensi untuk ketebalan diambil berdasarkan ketebalan tertipis dari hasil pengukuran spot secara random.

IV. LAPORAN PENGUJIAN

a. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK (NDT)

1. Shell / Badan

Jenis NDT : Wall Thichness
.....
.....
.....

No	Bagian yang di NDT	Lokasi	Cacat		Keterangan
			Ada	Tidak ada	
1	Head atas	4 titik		√	
2	Shell	4 Titik		√	
3	Head Bawah	4 titik		√	

Gambar :

Pengukuran Tebal	Hasil Pengukuran Tebal
	

2. Head/Tutup Ujung

Jenis NDT : MPI
.....
.....
.....

No	Bagian yang di NDT	Lokasi	Cacat		Keterangan
			Ada	Tidak ada	
1	T JOINT	Shell-Head	-	Tidak ada	
2	Butt Joint	Shell			

Gambar :

Pengujian NDT MPI	Hasil Pengujian NDT MPI
	

b. METODE PENGUJIAN TEKANAN

No	Data Pengujian	Simbol		Keterangan
1.	Tekanan Desain	DP	11 Kg/ Cm^2	
2.	Tekanan Kerja	WP	10 Kg/ Cm^2	
3.	Tekanan Uji	TP	14 Kg/ Cm^2	
4.	Temperature Ambient			
5.	Waktu Penahanan			
	a. Tekanan Desain/Kerja	T0	5 menit	
	b. Tekanan Uji	T1	5 menit	
6.	Kenaikan Temperatur			

Catatan:


c. METODE PENGUJIAN SAFETY VALVE

No	Perlengkapan	Tekanan Setting	Membuka	Menutup	Keterangan
1	Tingkap Pengaman I	11	10	6	

Catatan

V. HASIL PENGUKURAN KETEBALAN DAN PERHITUNGAN

LAPORAN HASIL PENGUKURAN KETEBALAN

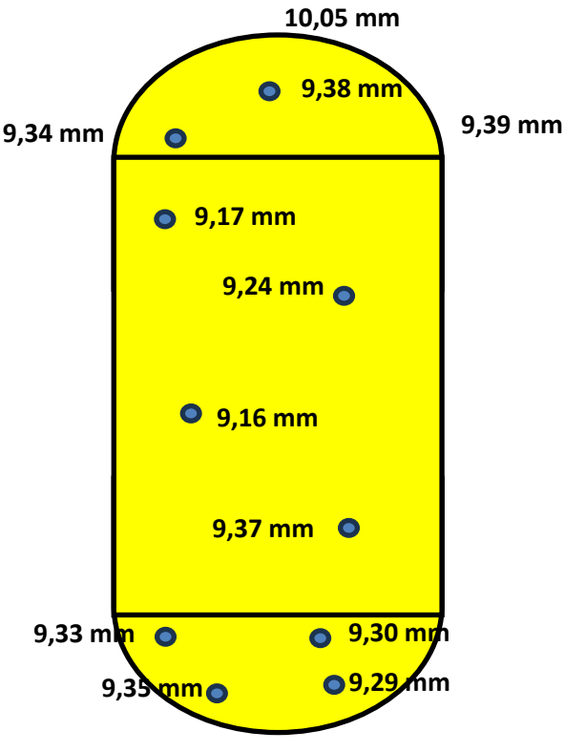

No	Item	Area					Design Thickness	Min. Thickness
		T1	T2	T3	T4	T5		
1	Head Atas	9,34	10,05	9,39	9,37	9,38	10	9,34 mm
2	Shell	9,17	9,24	9,16	9,25	9,37	10	9,16 mm
3	Head Bawah	9,33	9,30	9,35	9,31	9,29	10	9,29 mm

1. Pengujian Tidak Merusak (NDT) :

Pengujian Wall Thickness dilakukan pada tanggal **06 Juli 2026** dengan hasil terlampir.

VI. HASIL PERHITUNGAN

Diketahui :

DP	=	11 kg/cm²		
WP	=	11 kg/cm²	= 159,54	psi
D	=	550 mm,	= 21,653	inch
r	=	275 mm	. = 10,826	inch
t	=	9.16 /9,34 mm		
E	=	100 % / 85 % = 1		
S	=	17500 (SA 516 Gr 70)		
C	=	1.0 mm		

Kalkulasi untuk Shell / badan bila Pressure Tank dengan tekanan operasi = 10 kg/cm² (Saat ini) maka:

$t = \frac{P \,.\, (r + C)}{SE - 0.6\,P} + C$	$t = \frac{159{,}54 \,.\, (10{,}826 + 1)}{17500 \,.\, 1 - 0.6 \,.\, 159{,}54} + 1$

t = 0.138 inch = 3,53 mm

Jadi hasil ***t PENGUKURAN > Hasil t KALKULASI = 9,16 mm > 3,53 mm***
(Aman di Gunakan)

BILA ALAT AKAN TETAP DI OPERASIKAN DENGAN TEKANAN **(P) = 10 kg/cm².** SHELL / BADAN MASIH ***AMAN UNTUK DIGUNAKAN.***

$t = \frac{P\,(D+2C)}{(2S * E) - (0.2 * P)} + C$	$t = \frac{159{,}54\,(21{,}65 + 2C)}{2 \times 17500 \times 1 - 0.2 \times 159{,}54} + 1$

t = 0.138 Inch = 3,53 mm

JADI HASIL t PENGUKURAN > HASIL t KALKULASI = **9,340 mm > 3,53 mm** (AMAN DIGUNAKAN**).**

BILA ALAT AKAN TETAP DI OPERASIKAN DENGAN TEKANAN **(P) = 10 kg/cm².** HEAD / TUTUP MASIH ***AMAN UNTUK DIGUNAKAN.***

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian dengan kondisi diatas, dinyatakan bahwa Bejana Tekan jenis **Air Pressure Tank** dengan No. Serie : **TMH - 3013 -21,** Item No **: K3 BTU 001** lokasi di **Area Compressor Room, Bekasi 1 Plant - PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA, MEMENUHI PERSYARATAN K3 dan** dioperasikan dengan **Tekanan Tidak melebihi 10 Kg/cm^2** .

VIII. SYARAT - SYARAT

a. Tangki tidak boleh diisi melebihi Batas maksimal yang diizinkan dan pemilik bertanggung jawab penuh terhadap operasional secara aman.
b. Disarankan memberi batas tanda aman pada Pressure Gauge.
c. Pengoperasian bejana supaya memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
d. Mematuhi UU NO 1 th 1970 tentang keselamatan Kerja.
e. Mematuhi PERMENKER 37 tahun 2016 tentang Bejana tekanan & tangki timbun
f. Pemilik Bertanggung jawab atas keselamatan dan operasional terhadap unit ini.
g. Lakukan preventive pada safety divace sesuai schedule
h. Pemeriksaan dan Pengujian berkala berikutnya dilakukan selambat - lambatnya pada tanggal **06 Juli 2028.**

Jakarta, 13 Juli 2026
Pemeriksa
AK3 PU dan Bejana Tekan




Muh. Shobirien S.T

IX. DOKUMENTASI

Tampak Keseluruhan	**Man Hole**
	
Safety Valve	**Pressure Gauge (Beri Tanda Batas Aman)**
	
Nomor Aset	**Nameplate**
	

Inlet	Outlet
	
Support/ Pondasi	**Drain**
	
Pengukuran Ketebalan Tichness	**Hasil Pengukuran Ketebalan**
	

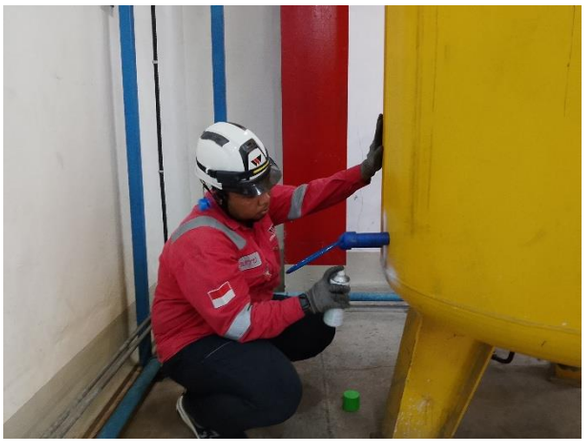Hasil Pengukuran Ketebalan	Proses NDT MPI
	
Hasil NDT MPI	**Stiker Riksa Uji**
	

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : http://www.naker.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 1318 /AS.01.02/XI/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi, syarat teknis, dan laporan kegiatan laporan kegiatan PT Upaya Riksa Daya oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari PT Upaya Riksa Daya Nomor : 040/URD/X/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun Nomor 5/15213/AS.01.04/X/2023 a.n Muh. Shobirien;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2310230099041;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 19011965;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 13210.20241030.0001, tanggal 30 Oktober 2024;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 76.651.453.3-003.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan	: **PT UPAYA RIKSA DAYA**
Alamat	: Jl. Pondasi No. 50B, Kampung Ambon, Jakarta Timur
Penanggung Jawab	: Mudjachid Machmud
Tenaga Ahli	: Muh. Shobirien
Bidang Kegiatan	: Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun

KEDUA : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2024

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Heryl Sulanto, S.T., M.M.
19710922 199703 1 002

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/15213/AS.01.04/X/2023

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun ditempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Sdr. **MUH. SHOBIRIEN, ST**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan petunjuk sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;

c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari PT Multi Prima Daya Perkasa Nomor : 198/SK-K3.PUBT/OPR/MPDP/IX/2023, tanggal 27 September 2023 perihal Permohonan Penerbitan SKP Ahli Keselamatan dan Kesehatan bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 No. 5/18/AS.01.04/X/2023 tgl 11 Oktober 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN**

KESATU : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan Kepada :**

Nama	:	**MUH. SHOBIRIEN, ST**
Tempat, tanggal lahir	:	MAGETAN, 13 Agustus 1973
Perusahaan	:	PT. UPAYA RIKSA DAYA
Alamat	:	JL. PONDASI NO.50 B, KAMPUNG AMBON, JAKARTA TIMUR

KEDUA : Kepada Ahli tersebut pada Diktum KESATU diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 2023

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Dr. Haiyani Rumondang, M.A
NIP 19640419 198903 2 001



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
WILAYAH II
Jl. Husni Hamid No. 55.A, Nagasari, Karawang Barat
email : bppkwilayah2@gmail.com
KARAWANG – 41311

SURAT KETERANGAN
Nomor : 566.2 / 7553 / UPTD-WIL. II / IX / 2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan sepenuhnya oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan Sdr. Muh. Shobirien, ST No.SKP. 5 / 15213 / AS.01.04 / X / 2023, dari PJK3 PT. UPAYA RIKSA DAYA yang beralamat Jl. Pondasi No. 50B Kampung Ambon, Jakarta Timur, pada tanggal 29 Juli 2024 terhadap pemakaian Bejana Tekan (Air Pressure Tank) di **PT. COCA - COLA BOTTLING INDONESIA** dan sesuai Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Nomor : 867/INSP-PUBT/PJK3-URD/VII/2024 diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

1. Nama Perusahaan	:	PT. COCA - COLA BOTTLING INDONESIA
2. Alamat Perusahaan	:	Jl. Teuku Umar KM. 46, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat
3. Lokasi Pengguna	:	Area Compressor Room, Bekasi 1 Plant

B. DATA TEKNIS

1. Jenis Alat	:	Bejana Tekan (Air Pressure Tank)
2. Bentuk	:	Silinder Tegak
3. Pabrik Pembuat	:	N/A
4. Tempat & Tahun Pembuatan	:	Indonesia / Jawa Barat / Sep - 2021
5. Jenis Fluida	:	Udara
6. Kapasitas / Volume	:	3000 Liter
7. Tekanan Desain	:	11 Kg/Cm^2
8. Tekanan Kerja	:	10 Kg/Cm^2
9. Nomor Seri	:	TMH - 3013 - 21 (K3 BTU 001)

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
Hasil Pemeriksaan dan Pengujian terhadap Bejana Tekan (Air Pressure Tank) secara rinci sebagaimana terlampir.

D. EVALUASI (Alasan Teknis)
Berdasarkan evaluasi terhadap laporan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan sepenuhnya oleh PJK3 PT. UPAYA RIKSA DAYA bahwa Bejana Tekan (Air Pressure Tank) tersebut telah memenuhi persyaratan K3.

E. KESIMPULAN
MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/ pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karawang, 5 September 2024

Mengetahui:
Plt. Kepala UPTD
Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah II

H. DANI PRIANTO HADI, ST., MM., MH.
Pembina
NIP. 19730111 199803 1 003

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan

H. ANGGA WIJAYA, SH, ST.
NIP. 19820917 200901 1 003
SKP: Kep. 39/NAKER-BINWASK3/I/2016

Proses Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan ini tidak dikenakan biaya

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
WILAYAH II
Jl. Husni Hamid No. 55.A, Nagasari, Karawang Barat
e-mail : bppkwilayah2@gmail.com
Karawang – 41311

SURAT KETERANGAN

Nomor: 566.2/6980/UPTD-WIL.II/VII/2026

Berdasarkan pemeriksaan/pengujian yang telah dilakukan sepenuhnya oleh Ahli K3 Pesawat Uap & Bejana Tekan MUH SHOBIRIEN, ST SKP No. 5/15213/AS.01.04/X/2023 dari PJK3 **PT UPAYA RIKSA DAYA** yang beralamat : Jl. Pondasi No 50B, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, pada tanggal 06 Juli 2026 mengenai BEJANA TEKAN di **PT Coca - Cola Bottling Indonesia** dan sesuai laporan pemeriksaan dan pengujian Nomor : 1525/INSP-PUBT/PJK3-URD/VII/2026, di terangkan bahwa:

A. Data Umum Objek Pengujian

1. Nama Perusahaan Pemilik	:	PT Coca - Cola Bottling Indonesia
2. Alamat Perusahaan Pemilik	:	Jl.Teuku Umar KM.46, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat
3. Jenis Objek	:	BEJANA TEKAN
4. Lokasi Penggunaan	:	Area Compressor Room, Bekasi I Plant

B. Data Teknis Objek Pengujian

1. Jenis Bejana Tekan	:	Air Pressure Tank
2. Model / Type	:	Silinder Tegak
3. Perusahaan Pembuat	:	N/A
4. Tempat dan Tahun Pembuatan	:	Indonesia / 2021
5. Working Pressure	:	10 Kg/ Cm2
6. Design Pressure	:	11 Kg/ Cm2
7. Kapasitas / Volume	:	3.000 Liter
8. Nomor Seri / No. Unit	:	TMH - 3013 – 21
9. Media yang diisikan	:	Udara

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui:
Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah II

PONCO WIDODO, S.P., M.A.P.
Pembina
NIP. 19680824 199803 1 006

Scan untuk verifikasi

Karawang, 03 Agustus 2026
Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3
Pesawat Uap & Bejana Tekan

H. ANGGA WIJAYA, SH, ST
NIP. 19820917 200901 1 003
SKP.KEP. 39/NAKER-BINWASK3/I/2016

Proses pelayanan penerbitan Surat Keterangan ini tidak dikenakan biaya
