2026

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SERTIFIKASI
INSTALASI PROTEKSI KEBAKARAN

Perusahaan : **PT Princeton Digital Group Data Centres**
Jenis : **IPK / INSTALASI ALARM SYSTEM**
SN : **-**
Lokasi : **Gedung PT Princeton Digital Group Data Centres - Bintaro (PDG JB 01)**
Inspected : **14 Agustus 2026**
Re-Inspection : **14 Agustus 2027**



PT. UPAYA RIKSA DAYA
Jl. Pondasi No. 50B Kampung Ambon, Jakarta Timur. 13210
Phone: 021 4891409 | 021 4715699,021 47861912
Email : urd@upayariksadaya.com Web. upayariksa.com

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN & PENGUJIAN BERKALA
INSTALASI PROTEKSI KEBAKARAN
Nomor : 352/INSP-IPK-IA/PJK3-URD/VIII/2026

I. DASAR HUKUM PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

1. Undang Undang No 1 tahun 1970 tentang **Keselamatan Kerja**.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No.PER.04/MEN/1980 tentang **Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.**
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.No.PER.02/MEN/1983 tentang **Instalasi Alarm Kebakaran Automatik**.
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep.186/MEN/1999 tentang **Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.**
5. Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins.11/M/BW/1997 tentang **Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran.**
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang **Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja**
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa **Keselamatan dan Kesehatan Kerja.**

II. DATA PEMERIKSA DAN PENGUJI

1	Nama Perusahaan	:	PT. UPAYA RIKSA DAYA
2	Alamat Perusahaan	:	Jl. Pondasi No.50 B Rawamangun.
3	No. SKP Perusahaan	:	Nomor 5/1362/AS.01.02/XI/2025
4	Tanggal SKP Perusahaan	:	11 November 2025
5	Nama Ahli K3	:	Heru Dwi Cahyono
6	No. SKP Ahli K3	:	5/10403/AS.01.04/V/2025
7	Tanggal SKP Ahli K3	:	15 Mei 2025

III. DATA UMUM

1	Nama Gedung / Bangunan	:	PT Princeton Digital Group Data Centres
2	Alamat Perusahaan	:	Menara Astra 37th Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 Indonesia
3	Lokasi Pemakaian	:	Gedung PT PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRES – Bintaro (PDG JB 01) – Jalan HR Rasuna Said Sektor 7 Kav 6-7 Bintaro, Tangerang Selatan, Banten
4	Penggunaan Bangunan	:	Perkantoran
5	Nama Pemilik/Pimpinan/Dir	:	-
6	Instalatir	:	-
7	Alamat Instalatir	:	-
8	Status Riksa Uji	:	~~Baru~~ / Berkala
9	Tanggal Riksa Uji	:	14 Agustus 2026
10	No. Surat Keterangan	:	566/2833-DTKT/K3-IPK/IX/2025

IV. DATA BANGUNAN

1	Luas Lahan	:	± 2.142 m^2
2	Luas Bangunan Total	:	± 5.000 m^2
3	Konstruksi Bangunan	:	Permanen
	- Struktur Utama	:	Beton Bertulang
	- Struktur Lantai	:	Cor, Paving, Keramik
	- Dinding Luar	:	Tembok,
	- Dinding Dalam	:	Tembok dan Gypsum
	- Rangka Plapond	:	Baja Ringan
	- Rangka Atap	:	Besi
	- Penutup Atap	:	Beton
4	Tinggi Bangunan	:	± 18,8 meter
5	Jumlah Lantai	:	4 Lantai
6	Jumlah Luas Lantai	:	± - m^2
7	Dibangun Tahun	:	-
8	Klasifikasi Risiko Kebakaran	:	Ringan
9	Perlengkapan Proteksi Kebakaran	:	

9.1 ( ) Alat Pemadam Api Ringan

9.2 (√) Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik

9.3 ( ) Instalasi Hydrant

9.4 ( ) Instalasi Sprinkler

9.5 ( ) Instalasi Khusus *).....

9.6 ( ) Sarana Evakuasi

V. JENIS PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Jenis Pemeriksaan dan Pengujian yang dilakukan :

1. (√) Pemeriksaan Dokumen.
2. (√) Pemeriksaan Visual.
3. (√) Pengujian Peralatan / Instalasi.

Catatan *)

1. PEMERIKSAAN DOKUMEN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL	KETERANGAN
1	Gambar Layout Gedung / Perusahaan	Ada	
2	Gambar Instalasi	Ada	Sesuai Perlindungannya
3	Dokumen Spesifikasi Peralatan	Ada	
4	Dokumen Pemeliharaan	Ada	

2. PEMERIKSAAN VISUAL DAN PENGUJIAN PERALATAN

	SPESIFIKASI TEKNIK INSTALASI ALARM KEBAKARAN OTOMATIK	Bentuk 66 – K (A)

NO	PERALATAN	MERK/ MODEL	JUMLAH	STATUS	KETERANGAN
1	Panel Kontrol/MPCFA	Edward / 10 Series	1	Ada	
2	Announciator	Edward	1	Ada	
3	Detektor Panas / ROR	Edward	4	Ada	
4	Detektor Asap / Smoke Detector	Edward	73	Ada	
5	Detektor Nyala / Fix	-		-	
6	Detektor Gas	-		-	
7	Tombol Manual	Edward	5	Ada	
8	Alarm Bell	Edward	5	Ada	
9	Sinyal Lampu Alarm	Edward	5	Ada	

Catatan :
-

DATA PEMASANGAN INSTALASI ALARM

Lantai	Lokasi	Zona	DETEKTOR			TPM	Fl.Sw	ALARM		STATUS
			ROR	Fixed	Smoke			Bell	Lamp	
Lantai 1	Koridor dan lobby	1	-	-	7	2	-	2	2	Baik
	R. ME		-	-	5	-	-	-	-	Baik
	R. Genset, Trafo		4	-	8	-	-	-	-	Baik
Lantai 2	Koridor, Lift, Tangga	2	-	-	8	1	-	1	1	Baik
	R. ME		-	-	4	-	-	-	-	Baik
Lantai 3	Koridor Lobby	3	-	-	7	1	-	1	1	Baik
	R. ME		-	-	5	-	-	-	-	Baik
Lantai 4	Koridor, Lift, Tangga	4	-	-	7	1	-	1	1	Baik
	R. ME		-	-	6	-	-	-	-	Baik
	NOC Room		-	-	16	-	-	-	-	Baik
Total			4	-	73	5	-	5	5	

Catatan : -

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI FIRE ALARM

Lantai	Lokasi	Zona	DETEKTOR			TPM	Fl.Sw	ALARM		STATUS
			ROR	Fixed	Smoke			Bell	Lamp	
Lantai 1	Koridor dan lobby	1	-	-	2	2	-	2	2	Baik
	R. ME		-	-	1	-	-	-	-	Baik
	R. Genset, Trafo		-	-	2	-	-	-	-	Baik
Lantai 2	Koridor, Lift, Tangga	2	-	-	2	1	-	1	1	Baik
	R. ME		-	-	1	-	-	-	-	Baik
Lantai 3	Koridor Lobby	3	-	-	2	1	-	1	1	Baik
	R. ME		-	-	1	-	-	-	-	Baik
Lantai 4	Koridor, Lift, Tangga	4	-	-	2	1	-	1	1	Baik
	R. ME		-	-	1	-	-	-	-	Baik
	NOC Room		-	-	4	-	-	-	-	Baik
Total			-	-	18	5	-	5	5	

Catatan :
Dari total smoke detector 73 titik dilakukan pengujian sebanyak 18 titik atau 34 %
Dari total Manual Call Point 5 titik dilakukan pengujian sebanyak 5 titik atau 100 %

HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI ALARM

NO	PEMERIKSAAN / PENGUJIAN	HASIL	SYARAT – SYARAT
1	Fungsi Kerja Panel (MCFA) :	• MCFA dalam kondisi terawat • Panel indikator dalam kondisi standby • Battery masih dalam kondisi baik • Indikator indikator berfungsi • Respon time aktif panel 4 detik setelah detektor diaktifkan. (hasil : MCFA berfungsi baik)	✓ dilakukan perawatan secara berkala ✓ dilakukan pengecekan battery secara berkala ✓ panel indikator fungsi agar selalu dalam kondisi standby
2	Test Alarm	• Setiap detektor yang diuji (pada setiap zonanya) berfungsi baik • Tombol manual berfungsi • Alarm lokal berfungsi baik • Audible dan Visible Alarm berfungsi baik • Alamat penunjuk pada MCFA sesuai dengan detektor yang diaktifkan/ditest (hasil : Detektor, MCFA, MCP, Alarm, dan Lampu Berfungsi Baik)	✓ Harus dilakukan perawatan secara berkala. ✓ Dilakukan pengetesan fungsi alarm secara rutin.
3	Interkoneksi	test interkoneksi kondisi baik.	Harus Dilakukan test interkoneksi
4	Test Open Circuit	(hasil: tidak dilakukan test open circuit)	✓ Dilakukan perawatan dan pengetesan secara berkala

KESIMPULAN

✓ Sistem alarm otomatis **Memenuhi Persyaratan Keselamataan dan Kesehatan Kerja.**

Catatan :

Dilakukan perawatan, dijaga kebersihan dan kerapihan terhadap semua system alarm, serta dilakukan pengujian secara berkala.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dan pengujian Instalasi Alarm System yang telah dilaksanakan oleh PT. UPAYA RIKSA DAYA pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 di **PT PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRES**, dinyatakan **MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**.

VII. SARAN

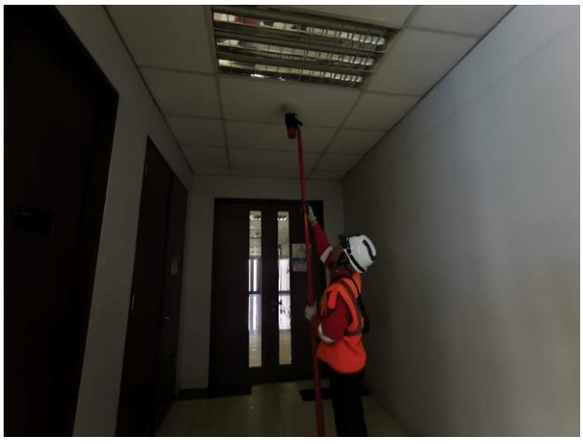
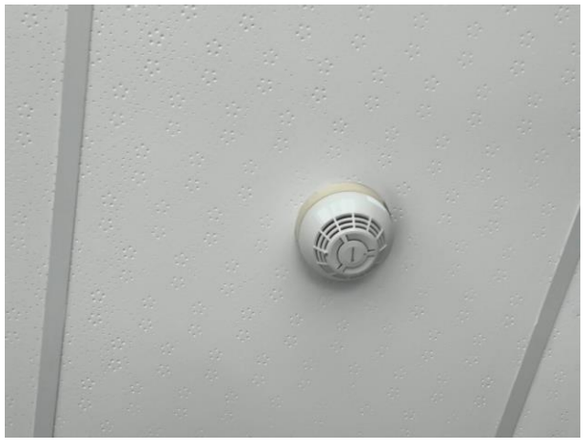
1. Alarm harus dalam kondisi stanby / aktif.
2. Lakukan perawatan dan pembersihan detector secara rutin
3. Agar selalu diadakan perawatan dan pemeliharaan dengan baik oleh petugas khusus perusahaan yang berpengalaman dibidang proteksi kebakaran.
4. Pemakai / Pengguna Instalasi Proteksi Kebakaran bertanggung jawab terhadap pemeliharaan / perawatan.
5. Dilakukan pemeriksaan/pengujian berikutnya/berkala paling lama 1 (satu) tahun setelah pemeriksaan/pengujian dilakukan, yaitu pada tanggal **14 Agustus 2027**.

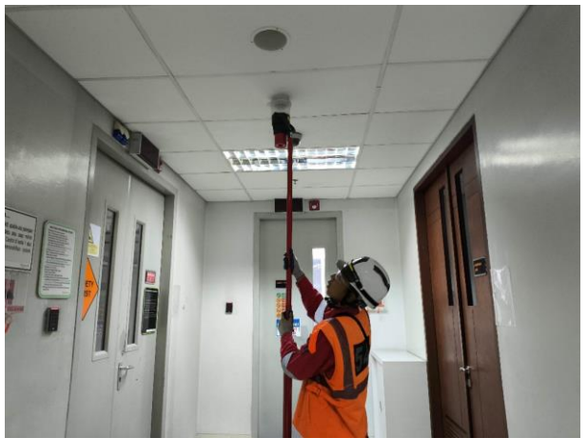
Jakarta, 18 Agustus 2026
Ahli K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran



Heru Dwi Cahyono
5/10403/AS.01.04/V/2025

VIII. DOKUMENTASI

Panel MCFA	**Panel MCFA**
	
Smoke detector	**Pengujian Smoke Detector**
	
Smoke detector	**Pengujian Smoke Detector**
	

Pengujian Smoke Detector	**Pengujian Smoke Detector**
	
Pengujian MCP	**Pengujian MCP**
	
Pengujian Smoke Detector	**Stiker Riksa Uji**
	

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home Page : http://www.kemnaker.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 1362 /AS.01.02/XI/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT UPAYA RIKSA DAYA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Sarana Proteksi Kebakaran;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.04 tahun 1980 tentang Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari PT UPAYA RIKSA DAYA Nomor : 042/URD/VIII/2025 tanggal 11/08/2025 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3 Bidang Sarana Proteksi Kebakaran;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Kebakaran Nomor 5 / 10403 / AS.01.04 / V / 2025 a.n HERU DWI CAHYONO;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2310230099041;
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 19011965;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 13210.20251031.0001, tanggal 31/10/2025;
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 76.651.453.3-003.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan	: **PT UPAYA RIKSA DAYA**
Alamat	: Jl. Pondasi No.50 B, Kampung Ambon, Jakarta Timur
Penanggung Jawab	: Mudjachid Machmud
Tenaga Ahli	: HERU DWI CAHYONO
Bidang Kegiatan	: Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Sarana Proteksi Kebakaran

KEDUA : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 November 2025

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Drs. Muhamad Idham, M.K.K.K.
19660925 199303 1 002

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 10403 / AS.01.04 / V / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **HERU DWI CAHYONO**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukkan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Kep.186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Pimpinan PT UPAYA RIKSA DAYA Nomor 2786/URP/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Permohonan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran Nomor 5/09/AS.01.04/V/2025 tanggal 15 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran kepada:**

Nama	:	**HERU DWI CAHYONO**
Tempat, Tanggal Lahir	:	KUDUS, 24-09-1995
Perusahaan	:	PT UPAYA RIKSA DAYA
Alamat	:	JL.PONDASI NO.50B, KAMPUNG AMBON, JAKARTA TIMUR

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2025

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Fahrurozi, SH., M.A
NIP. 19660312 198603 1 003

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syeh KH. Nawawi Al Bantani
Telp (0254) 267111 Fax. (0254) 267112 Kota Serang 42171

SURAT KETERANGAN

No : 566/ 2833 -DTKT/K3-IPK/IX/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh PJK3 - PT. Citra Media Sarana, pada tanggal 1 September 2025 terhadap Instalasi Proteksi Kebakaran, diterangkan bahwa:

A. Data Umum Objek Pengujian

1. Jenis Obyek K3 yang diuji : Instalasi Automatic Fire Alarm System
2. Nama Perusahaan : **PT. PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRES**
3. Alamat Perusahaan : Menara Astra 37th Floor Jalan Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 Indonesia
4. Lokasi Penggunaan : Gedung PT. PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRES BINTARO, Jalan HR Rasuna Said Sektor 7 Kav 6-7 Bintaro, Tangerang Selatan

B. Data Teknis Objek Pengujian

1. Klasifikasi Bangunan : Bangunan Bertingkat (Resiko Sedang)
2. Luas Lahan : ± 2.142 m^2
3. Luas Bangunan : ± 5.000 m^2
4. Sumber Listrik : PLN 4.330 KVA
   Genset 4 Unit = @1.256 KVA, Total = 5.380 KVA
5. Struktur Utama : Besi Beton Bertulang
6. Struktur Lantai : Cor, Piping, Keramik

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan / atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya (paling lambat 1 September 2026), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serang, 22 September 2025

Mengetahui, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten	Yang Melakukan Evaluasi Pengawas Ketenagakerjaan
SEPTO KALNADI	**MUSTAHAL**
NIP. 19680916 198903 1 010	NIP. 19680109 199103 1 006

Catatan: Pengurusan dokumen Surat Keterangan ini tidak dipungut biaya
