# 2026

# LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SERTIFIKASI INSTALASI LISTRIK

| | |
|---|---|
| **Perusahaan** | **: PT Princeton Digital Group Data Centres** |
| **Jenis** | **: Instalasi Listrik** |
| **SN** | **: - / 4.330 kVA** |
| **Lokasi** | **: Area Gedung PT Princeton Digital Group Data Centres Bintaro (PDG JB 01)** |
| **Inspected** | **: 13 Agustus 2026** |
| **Re – Inspection** | **: 13 Agustus 2027** |




**PT. UPAYA RIKSA DAYA**
**Jl. Pondasi No. 50B Kampung Ambon, Jakarta Timur. 13210**
**Phone: 021 4891409 | 021 4715699,021 47861912**
**Email : urd@upayariksadaya.com Website. upayariksa.com**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN**
**INSTALASI LISTRIK**
**No. 335/INSP-IL/PJK3-URD/VIII/2026**

## I. DATA UMUM

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Nama Perusahaan/Instansi | PT Princeton Digital Group Data Centres |
| 2 | Alamat | Menara Astra 37th Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 Indonesia |
| 3 | Alamat Pemakai | Jalan HR Rasuna Said Sektor 7 Kav 6-7 Bintaro, Tangerang Selatan, Banten |
| 4 | Jenis Unit | Instalasi Listrik |
| 5 | Jenis Pemeriksaan | Berkala |
| 6 | Nomor Izin Pemakaian | 566/2827-DTKT/K3-IL/IX/2025 |
| 7 | Pelaksanaan riksa uji | 13 Agustus 2026 |

## II. DATA TEKNIS

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Sumber Tenaga Listrik | PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) |
| 2 | Tahun Instalasi | - |
| 3 | Instalatir Pemasang | n/a |
| 4 | Tenaga Listrik dari PLN | 4.330 kVA |
| 5 | Jenis Arus/ Tegangan Kerja | 3 Phase, 50 Hz, 220 / 380 Volt |
| 6 | Jumlah Daya Tenaga | 1.750,970 kVA |
| 7 | Jumlah Daya Penerangan | 46,044 kVA |

## III. INSPECTION CHEKLIST

| No | Item Pemeriksaan | Hasil Pemeriksaan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ada | Tidak Ada | Ket |
| **A. Pemeriksaan Dokumen** | | | | |
| 1. | Perencana Memiliki Ijin/ Penunjukan /Pengesahan | √ | - | |
| 2. | Peta Lokasi | √ | - | |
| 3. | Gambar Diagram Garis Tunggal Lengkap Dengan Besaran Nominalnya | √ | - | |
| 4. | Gambar Layout Instalasi, Pengkabelan, Pembebanan, Sistem Pengamanan Lengkap Dengan Besaran Nominalnya. | √ | - | |
| 5. | Gambar Diagram Pengawatan | √ | - | |
| 6. | Gambar Area Klasifikasi | √ | - | |
| 7. | Daftar Komponen Panel | √ | - | |
| 8. | Perhitungan Arus Hub. Singkat | √ | - | |
| 9. | Buku Manual | √ | - | |
| 10. | Buku Pemeliharaan & Operasi | √ | - | |
| 11. | Tanda Peringatan | √ | - | |
| 12. | Sertifikat Pabrik Pembuat | √ | - | |
| 13. | Spesifikasi Teknik Peralatan Dan Perlengkapan Listrik. | √ | - | |
| 14. | Spesifikasi Teknis Dan Sertifikasi Peralatan | √ | - | |
| 15. | Perhitungan Teknis Instalasi. | √ | - | |
| 16. | Record Daily | √ | - | |

| NO | Item Pemeriksaan | Hasil Pemeriksaan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ada | Tidak Ada | Ket |
| **B. Pemeriksaan Visual** | | | | |
| 1. | Konstruksi Unit Switchgear | √ | - | |
| 2. | Dudukan Dan Penempatan | √ | - | |
| 3. | Klasifikasi Area | √ | - | |
| 4. | Perlindungan Terhadap Kejutan Listrik & Benda Asing | - | √ | |
| 5. | Pintu Panel Dilengkapi Penahan Saat Posisi Terbuka | √ | - | |
| 6. | Semua Baut Dan Skrup Telah Kuat | √ | - | |
| 7. | Busbar Terisolasi Dengan Kuat | √ | - | |
| 8. | Pemasangan Kabel | √ | - | |
| 9. | Kabel Yang Terpasang Pada Pintu Panel Dilindungi Terhadap Kerusakan | √ | - | |
| 10. | Terminal Kabel Dilengkapi Dengan Pelindung Kabel / Soket | √ | - | |
| 11. | Semua Peralatan & Terminal Diberi Kode Dan Nama Indikasi | √ | - | |
| 12. | Ukuran Busbar | √ | | |
| 13. | Busbar & Perlengkapan Yang Terpasang Bersih Tanpa Kotoran Dan Debu | √ | | |
| 14. | Penandaan Busbar (Phasa) | √ | - | |
| 15. | Pemasangan Kabel Pembumian | √ | | |
| 16. | Pemasangan Semua Pintu-Pintu Panel | √ | - | |
| 17. | Fasilitas Keselamatan Dan Tanda Bahaya | √ | - | |
| 18. | Cover Panel | √ | - | |

**Standar/referensi :**

1. Undang – Undang No.1 thn 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Permenakertrans RI No. 33/Men/2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
3. Persyaratan Umum Instalasi Listrik ( PUIL 2011 )


## IV. PENGUKURAN THERMAL PANEL

### STANDART THERMAL PANEL

| PERBEDAAN TEMPERATUR DARI TEMPERATUR MAXIMAL YANG DIIJINKAN | PRIORITAS PERBAIKAN |
|---|---|
| A : ≤ MAX. TEMP. | Normal for Dat/Normal untuk Data Monitor < 3 Bulan |
| B : ≥ 1°C - 10°C | Medium Heating/Pemanasan Sedang Perbaiki < 14 Hari |
| C : ≥ 11°C - 20°C | Serious Heating/Pemanasan Serius Perbaiki < 7 Hari |
| D : ≥ 21°C - 40°C | Acute Heating/ Pemanasan Akut Segera Perbaiki |
| E : ≥ 41°C | Critical Heating/ Pemanasan Kritis Segera Perbaiki |


| TEMPERATUR MAKSIMUM YANG DIIJINKAN | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coil Contactor, Coil Relay | 90,0 °C | Standart ANSI/IEEE C 37.63 – 1984 |
| 2 | Bushbar/Terminal Koneksi Bushbar/Konduktor | 70,0°C | Standart ANSI/IEEE |
| 3 | Terminal Koneksi | 60,0°C | Standart ANSI/IEEE C 37 – 1991 |
| 4 | Isolasi/Lapisan Raychem | 60,0°C | Standart ANSI/IEEE |
| 5 | Fuse Tegangan Rendah dan Tinggi Max. 200 Amper | 70,0°C | Standart ANSI/IEEE C 37.40 – 1981 |
| 6 | Bushing Trafo | 85,0°C | Standart ANSI/IEEE C 37 – 1991 |
| 7 | Bushing Circuit Breaker | 70,0°C | Standart ANSI/IEEE C 37 – 1991 |
| 8 | Case ACB/MCCB/MCB/PCB | 60,0°C | Standart ANSI/IEEE |
| 9 | Isolator/IS/DS/Support | 60,0°C | Standart ANSI/IEEE |

**Hasil Thermal Panel**
**Trafo 1**

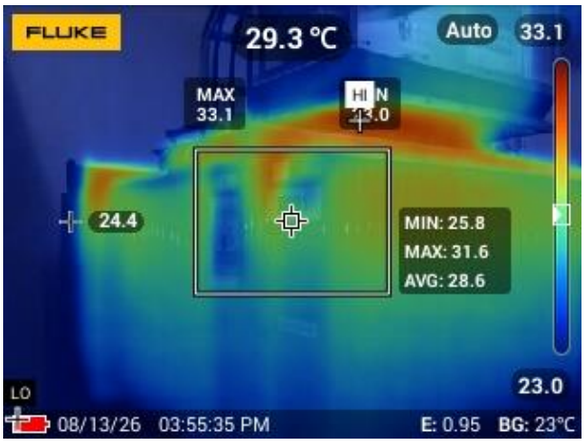




**Hasil Thermal Panel**
**Trafo 2**

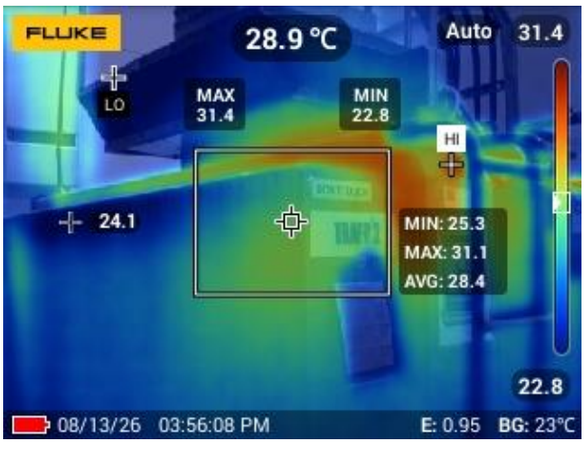






**Hasil Thermal Panel**
**LVMSB-1**








**Hasil Thermal Panel**
**Feeder - 1**

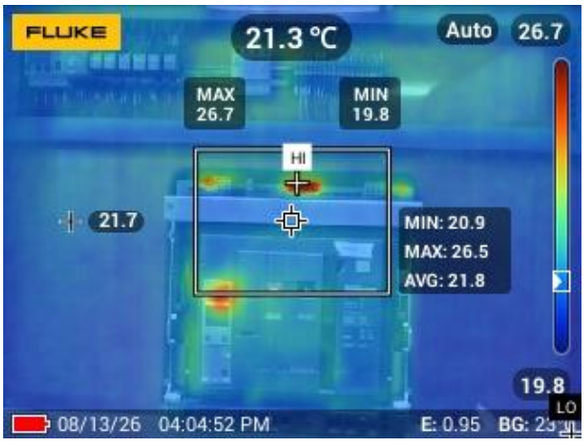





**Hasil Thermal Panel**
**LVSMB 2**

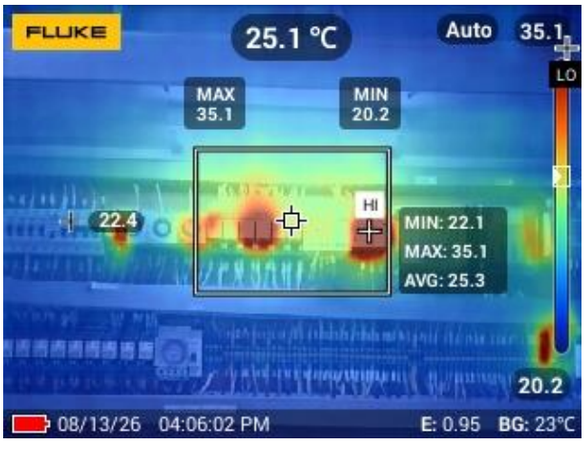

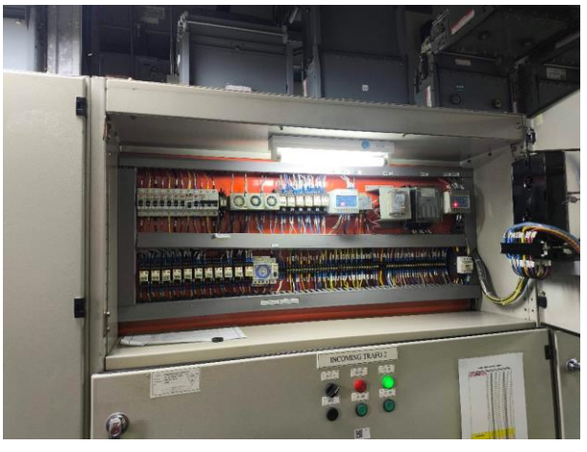



**Hasil Thermal Panel**
**LVMSB 2 (Incoming Trafo-2)**

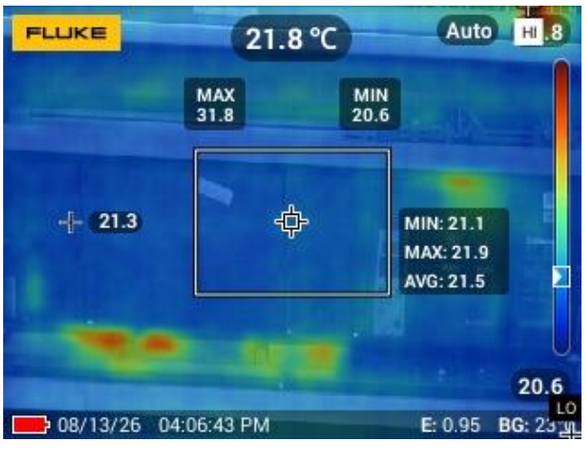





**Hasil Thermal Panel**
**Feeder 2**

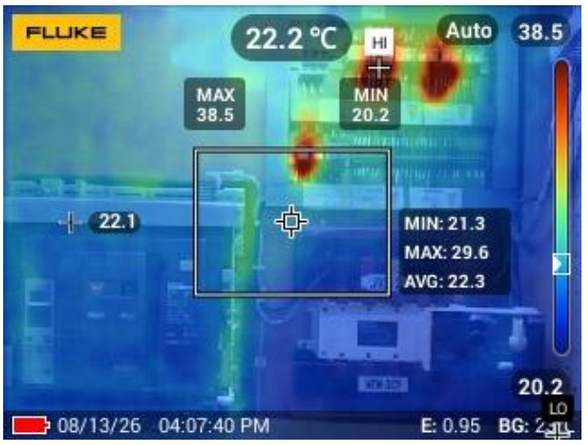





**Hasil Thermal Panel**
**DB PAC 1.1**

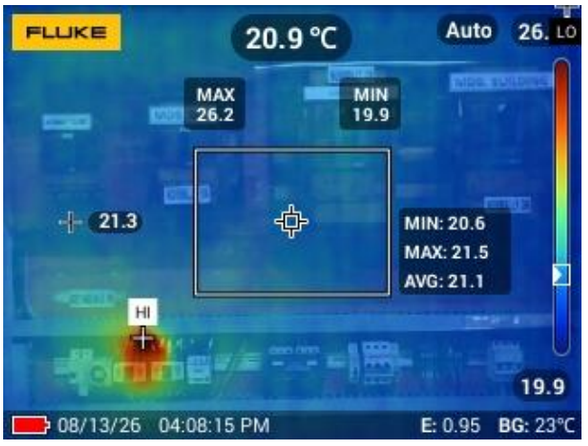






**Hasil Thermal Panel**
**LVMSB-2FS**

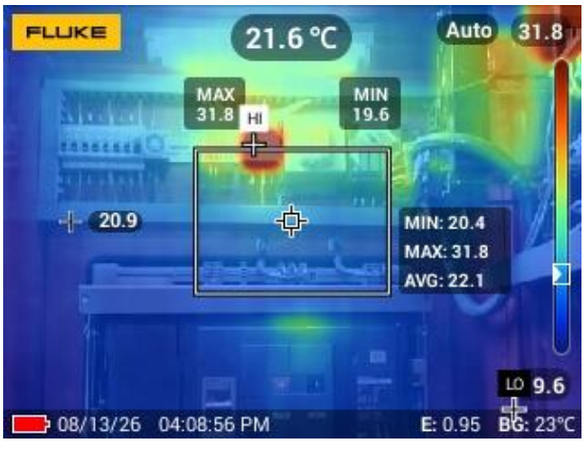






**Hasil Thermal Panel**
**DB-VAC 1**

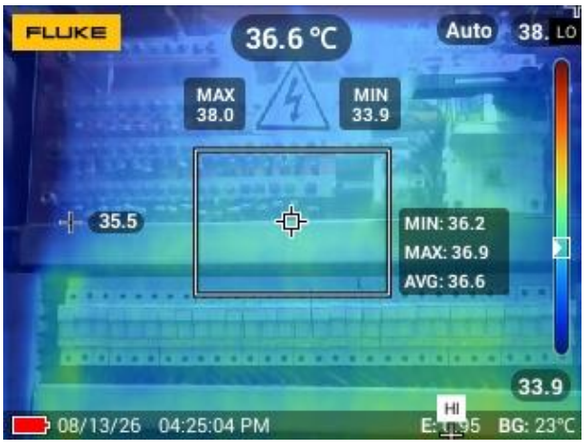

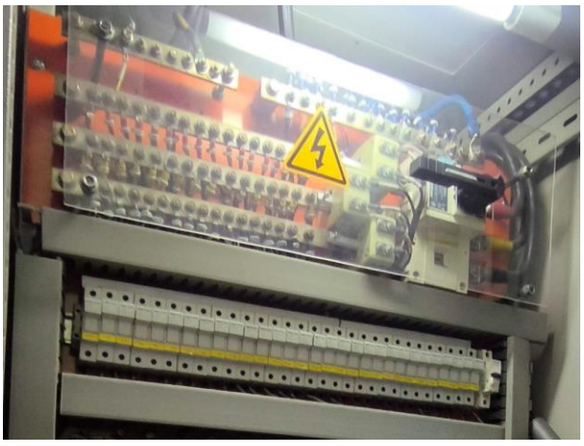

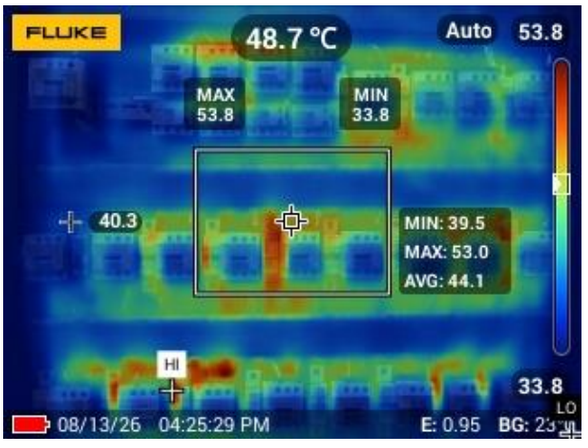
**Hasil Thermal Panel**
**MDB – BLD 1 (INCLUDE LP – COM.1)**

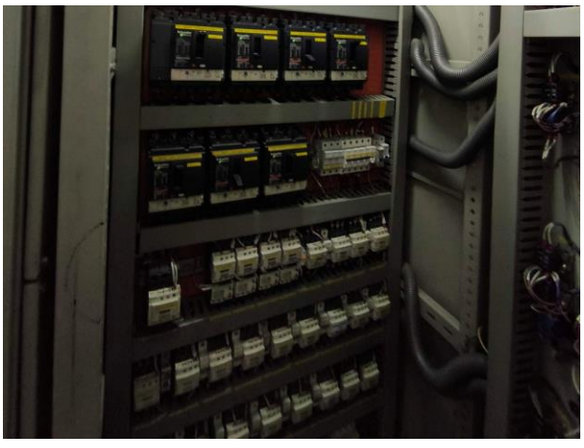




**Hasil Thermal Panel**
**LP – COM 2**



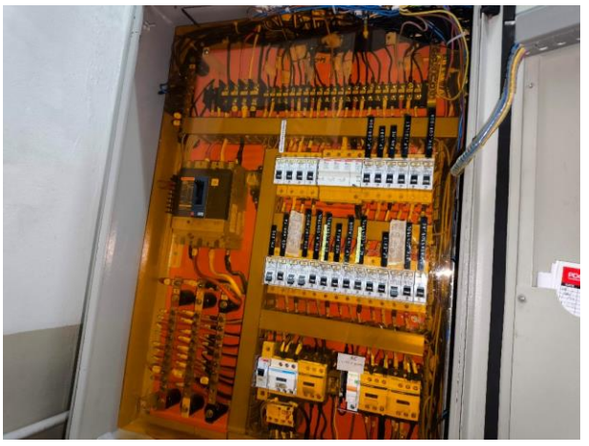



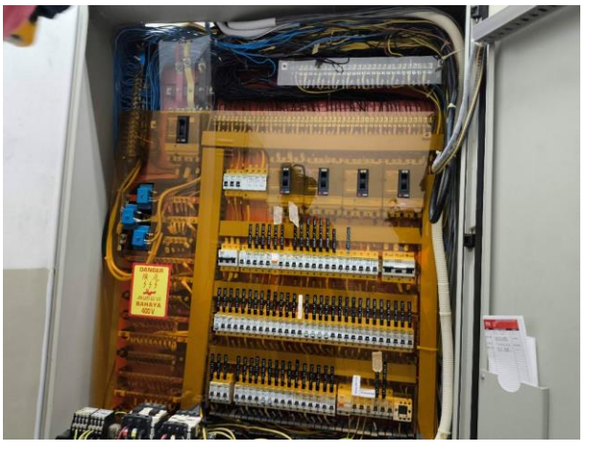
**Hasil Thermal Panel**
**LP – COM 3**






**Hasil Thermal Panel**
**DB-NOC 4 (INCLUDE LP_COM 4 & LP -NOC 4)**

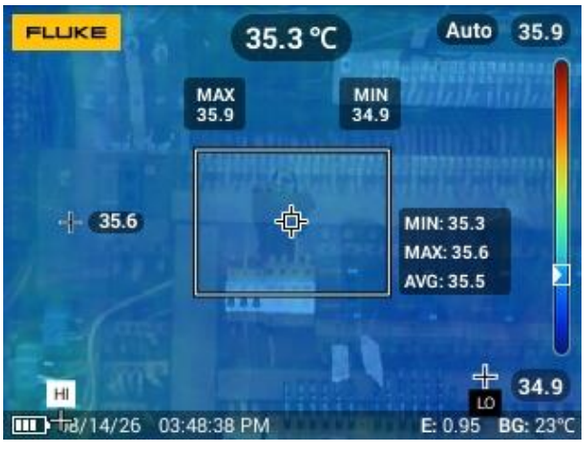





**Hasil Thermal Panel**
**DB-VAC 4**






**Hasil Thermal Panel**
**DB-PF.A**

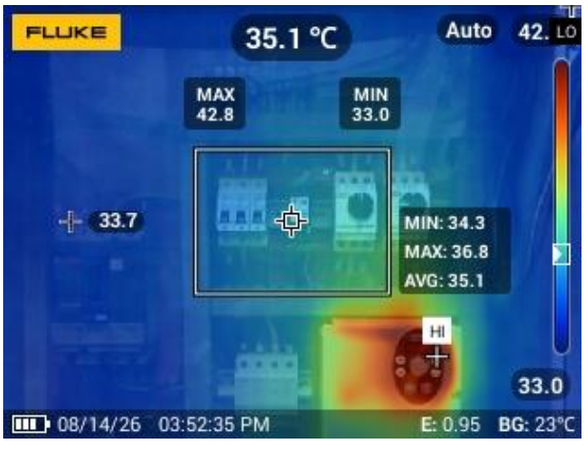




**Hasil Thermal Panel**
**DB-ATAP ( INCLUDE LP-ATAP )**






## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengujian **Instalasi Listrik** kami nyatakan **MEMENUHI PERSYARATAN K3** untuk di pergunakan di **Area Gedung PT PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRES – Bintaro (PDG JB 01)** dengan daya maksimum : **4.330 kVA**. Dalam pengujian thermal panel, masih dalam kondisi yang aman dan baik.

## VI. SARAN


1. Panel Listrik harus dimaintenance dan dirawat oleh Teknisi yang telah memiliki Sertifikat dan SIO (Surat Izin Operasi) dari Kemnaker RI.
2. Berikan kabel bounding pada setiap panel listrik untuk mencegah terjadinya tegangan sentuh langsung saat terjadi ganguan arus bocor
3. Perawatan dan inspeksi instalasi listrik harus dilakukan secara berkala sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku
4. Pengujian Panel Listrik paling lambat tanggal **13 Agustus 2027** harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala, sesuai dengan. **PERMEN NO 33/MEN/2015** tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja

**Jakarta, 18 Agustus 2026**
**Yang Memeriksa/Menguji**
**Ahli K3 Listrik**




**Asep Hermawan**
**5/18289/AS.01.04/XI/2025**

## VII. DOKUMENTASI
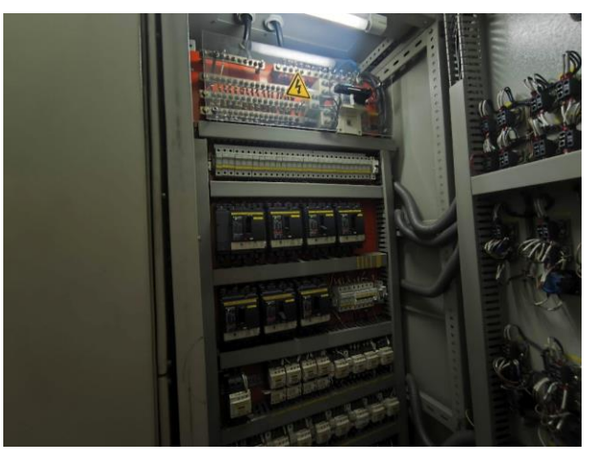
| | |
|---|---|
| **Tampak panel** | **Proses pengukuran thermal panel** |
|  |  |
| **Hasil pengukuran grounding panel** | **APAB** |
|   |  |
| **Tidak ada kabel bonding pintu panel** | **Tampak dalam panel** |
|  |  |

| Tampak Trafo | Tampak Trafo |
| --- | --- |
|  |  |

**Stiker hasil riksa uji**



# KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
## DIREKTORAT JENDERAL
## PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : http://www.naker.go.id


**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**
**NOMOR 5/ 1444 /AS.01.02/XII/2024**
TENTANG
**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**Menimbang** :
a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi, syarat teknis, dan laporan kegiatan laporan kegiatan PT Upaya Riksa Daya oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

**Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari PT Upaya Riksa Daya Nomor : 037/URD/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Listrik Nomor 5/14259/AS.01.04/VII/2024 a.n Agus Supriyanto;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2310230099041;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 19011965;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 13210.20241030.0001, tanggal 30 Oktober 2024;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 76.651.453.3-003.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

| | |
|---|---|
| Nama Perusahaan | : **PT UPAYA RIKSA DAYA** |
| Alamat | : Jl Pondasi No 50B, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur |
| Penanggung Jawab | : Mudjachid Machmud |
| Tenaga Ahli | : Agus Supriyanto |
| Bidang Kegiatan | : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir |

**KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2024

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Hery Sutanto, S.T., M.M.
NIP. 19710922 199703 1 002

# KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
# REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 5 / 18289 / AS.01.04 / XI / 2025

TENTANG

## PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK
## MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **ASEP HERMAWAN,** maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukkan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;

c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Ment eri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor Kep. 47/PPK&K3/VIII/2015 tentang Pembinaan Calon Ahli Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik.

**Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Pimpinan PT UPAYA RIKSA DAYA Nomor 7020/URP/VIII/2025 Tanggal 07 Agustus 2025 perihal Permohonan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;

2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Listrik Nomor 5/43/AS.01.04/XI/2025 tanggal 03 November 2025.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**KESATU** : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik kepada:**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **ASEP HERMAWAN** |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | MAJALENGKA, 16-06-1992 |
| Perusahaan | : | PT UPAYA RIKSA DAYA |
| Alamat | : | JL.PONDASI NO 50B KAMPUNG AMBON, JAKARTA TIMUR |

**KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 November 2025

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Ir. Ismail Pakaya, M.E
NIP. 19680113 199303 1 005

# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
# DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten ( KP3B ) Jl. Syeh KH. Nawawi Al Bantani
Telp ( 0254 ) 267111 Fax. ( 0254 ) 267112 Kota Serang 42171


## SURAT KETERANGAN

No : 566/2827-DTKT/K3-IL/IX/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh PJK3 - PT. Citra Media Sarana, pada tanggal 1 September 2025 terhadap Instalasi Listrik, diterangkan bahwa:

A. Data Umum Objek Pengujian

1. Jenis Obyek K3 yang diuji : Instalasi Listrik
2. Nama Perusahaan : **PT. PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRES**
3. Alamat Perusahaan : Menara Astra, 37th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220 Indonesia
4. Lokasi Penggunaan : Gedung PT. PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRES- Jalan HR Rasuna Said Sektor 7, Kav 6-7 Bintaro, Tangerang Selatan

B. Data Teknis Objek Pengujian

1. Daya yang Terpasang : 4.330 KVA
2. Nomor Seri Transformator 1 : 07130324
3. Nomor Seri Transformator 2 : 07130325
4. Untuk Penerangan : 46,044 KVA
5. Untuk Tenaga : 1.750,970 KVA

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan / atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya (paling lambat 1 September 2026), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serang, 12 September 2025

| Mengetahui,<br>Kepala Dinas Tenaga Kerja dan<br>Transmigrasi Provinsi Banten | Yang Melakukan Evaluasi<br>Pengawas Ketenagakerjaan |
|---|---|
| **SEPTO KALNADI** | **MUSTAHAL** |
| NIP. 19680916 198903 1 010 | NIP. 19680109 199103 1 006 |

Catatan: Pengurusan dokumen Surat Keterangan ini tidak dipungut biaya
