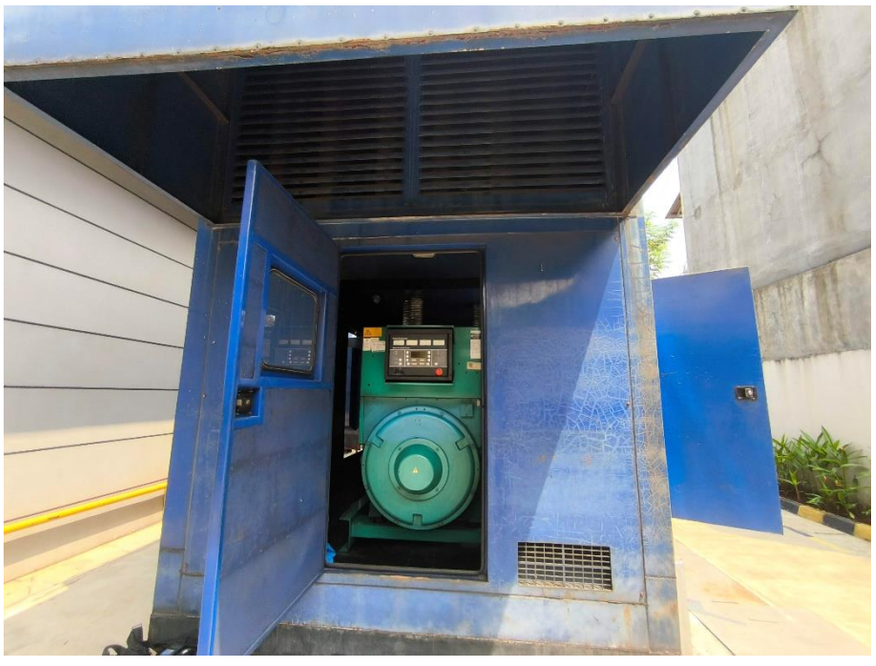
2026

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SERTIFIKASI PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI

Perusahaan	**: PT Princeton Digital Group Data Centres**
Jenis	**: PTP / Motor Diesel 4**
SN	**: 25350903 / 1.256 kVA / 2010**
Lokasi	**: Area Gedung PT Princeton Digital Group Data Centres – Ruang Genset (PDG JB 01)**
Inspected	**: 14 Agustus 2026**
Re- Inspection	**: 14 Agustus 2027**



PT. UPAYA RIKSA DAYA
Jl. Pondasi No. 50B Kampung Ambon, Jakarta Timur. 13210
Phone: 021 4891409 | 021 4715699,021 47861912
Email : urd@upayariksadaya.com Web. upayariksa.com

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI
(MOTOR DIESEL)
No.1509/INSP-PTP/PJK3-URD/VIII/2026

I. DATA UMUM

1	Perusahaan Pemilik	PT PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRES
2	Alamat	Menara Astra 37th Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 Indonesia
3	Lokasi Pemakai	Gedung PT PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRES – Ruang Genset (PDG JB 01)
4	Alamat	Jalan HR Rasuna Said Sektor 7 Kav 6-7 Bintaro, Tangerang Selatan, Banten
5	Pengurus / Penanggung Jawab	-
6	Lokasi Unit	Area Gedung PT PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRES – Ruang Genset (PDG JB 01)
7	Jenis Pesawat / Type	Motor Diesel 4
8	Merk / Type	Cummins / KTA-50-G3
9	No. Seri / No. Unit	25350903
10	Lokasi / Tahun Pembuatan	India / 2010
11	Kapasitas	1.256 kVA
12	Digunakan Untuk	Sumber Listrik Cadangan
13	No. SKP PJK3 / Bidang	5/1312/AS.01.02/XI/2024 / Pesawat Tenaga Produksi
14	No. SKP / Bidang AK3	5/0098220426/AS.01.04/IV/2026 / Ahli K3 Pesawat Tenaga Produksi
15	Klasifikasi	Stationer
16	Nomor Izin Pemakaian	566/2832-DTKT/K3-PTP/IX/2025
17	Nama Operator	-
18	Jenis Pemeriksaan	Berkala
19	Tanggal Riksa Uji	14 Agustus 2026
20	Diperiksa Oleh	PT. Upaya Riksa Daya

II. PEMERIKSAAN DOKUMEN TEKNIS

A. MOTOR DIESEL		
1	Merk / Type	Cummins / KTA-50-G3
2	Pabrik Pembuat / Negara	Cummins India Limited / India
3	Tahun Pembuatan	2010
4	Klasifikasi	Stationer
5	Nomor Seri	25350903
6	Daya	1470 HP
7	Tenaga Mula	ACCU
8	Jumlah Silinder	16 Silinder
B. GENERATOR		
1	Merk / Type	Cummins / C1400D5
2	Nomor Seri	C10S100164
3	Daya	1.256 kVA
4	Frekuensi	50 Hz
5	Putaran	1.500 rpm
6	Tegangan	380 Volt
7	Phasa dan Tegangan	3 Phasa, 220/380 Volt
8	Ambien Temperatur	40°C
9	Putaran	1500 Rpm

III. PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN

NO.	KOMPONEN	KONDISI		KETERANGAN
		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
A. KONSTRUKSI DASAR				
1	Pondasi Dasar	√		
2	Rumah Diesel	√		
3	Support / Penopang	√		
4	Anchor / Bolt	√		
B. STRUKTUR KONSTRUKSI				
1	Tangki Harian	√		
2	Muffler	√		
3	Bejana Angin	-	-	*n/a*
4	Panel	√		
C. SISTEM PELUMASAN				
1	Oli	√		
2	Oil Strainer / carter	√		
3	Oil Cooler	√		
4	Oli Filter	√		

5	By Pass Filter	√		
6	Safety Valve	-	-	*n/a*
7	Packing	√		
D. SISTEM BAHAN BAKAR				
1	Tangki Harian	√		
2	F I J (Fuel Injector)	√		
3	Sambungan - sambungan	√		
4	Float Tank	√		
5	Fuel Filter	√		
6	F I P (Fuel Injector Pump)	√		
7	Magnetic Screen	√		
8	Governor	√		
9	Troatle shaft	√		
10	Regulator	√		
11	Shut Off Valve	√		
E. ALAT BANTU MENGHIDUPKAN MESIN				
1	Feed Pump	√		
2	Fuel Valve	√		
3	Priming Ring Pump	√		
4	Heater Plug	√		
5	Heater Switch	√		
6	Pre Heater	√		
7	Water Signal	√		
8	Starting Switch	√		
9	Kutub - kutub Baterai	√		
10	Thermostart Tank	√		
11	Thermostart	√		
12	Heater Signal	√		
13	Thermostart Switch	√		
14	Glow Plug	√		
15	Engine Speed Sensor	√		
16	Manometer Bejana Tekan	√		
17	Service Meter	√		
18	Water Temperatur Sensor	√		
19	Motor Stater	√		
20	Safety Valve Bejana Tekan	-	-	*n/a*
21	Bejana Angin	-	-	*n/a*

F. SISTEM PENDINGIN				
1	Cooling Water	√		
2	Baut - baut Pengikat	√		
3	Klem Pengikat	√		
4	Radiator	√		
5	Thermostart	√		
6	Kipas / Fan	√		
7	Pelindung Kipas	√		
8	Putaran Kipas	√		
9	Bantalan / Dudukan	√		
G. SISTEM SIRKULASI UDARA				
1	Pre - Cleaner	√		
2	Dust Indicator	√		
3	Air Cleaner / Filter	√		
4	Turbo Charger	√		
5	Klem -klem Pengikat	√		
6	After cooler	√		
7	Muffler	√		
8	Silincer	√		
9	Peredam Panas	√		
10	Baut-baut Pengikat	√		
H. BAGIAN-BAGIAN UTAMA				
1	Baut - baut Peredam	√		
2	Suport / penopang	√		
3	Rumah Fly Wheel	√		
4	Fly Wheel	√		
5	Peredam Getaran	√		
6	Sabuk dan Puli	√		
7	Crankshaft / Poros Engkol	√		
I. GENERATOR				
1	Hubungan Terminal Generator	√		
2	Kabel dan Generator ke Panel Board	√		
3	Panel Board	√		
4	Ampere Meter	√		
5	Volt Meter	√		
6	Frequency	√		
7	Circuit Breaker	√		
8	Saklar On-Off	√		

J. TRANSMISI				
1	Roda Gigi	-	-	*n/a*
2	Transmisi Sabuk	-	-	*n/a*
3	Transmisi Rantai	-	-	*n/a*
K. MAIN DISTRIBUTOR PANEL				
1	Hubungan Kabel dari Panel Board ke Main Distributor Board	√		
2	Kondisi Main Distributor Board	√		
3	Ampere Meter	√		
4	Volt Meter	√		
5	Main Circuit Breaker	√		
L. SAFETY DEVICE				
1	Grounding	√		*Hasil pengukuran grounding 0,80 Ohm*
2	Penyalur Petir	-	-	*n/a*
3	Emergency Stop	√		
4	Governor	√		
5	Thermostart	√		
6	Water Signal	√		
7	Pelindung Kipas	√		
8	Silincer	√		
9	Peredam Getaran	√		
10	Circuit Breaker	√		
11	AVR (Automatic Voltage Regulator)	√		

IV. PENGUJIAN NDT			
NO.	**KOMPONEN YANG DIUJI**	**HASIL**	**KETERANGAN**
1	Putaran Poros Diesel (rpm)	1.500	
2	Pembumian (Grounding)	0,80 Ω	Standart ≤ 5 Ohm
3	Kebisingan	103.7 dB	Standart 85.0 dB
4	Pengukuran Pencahayaan	213 Lux	Standart 100 Lux
V. PENGUKURAN DAN PENGUJIAN SAFETY DEVICE			
1	Governor		Baik
2	Emergency Stop		Baik
3	Tahanan Pembumian (Grounding)	0,80 Ω	Baik
4	Tahanan Isolasi		Tidak dilakukan
5	Panel-panel Indikator / Listrik		Baik
6	Pressure Gauge	-	*n/a*
7	Temp. Indicator	40°C	Baik
8	Water Indiator		Baik
9	Katup-katup Pengaman		*n/a*
10	Radiator		Baik

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, **Motor Diesel 4** peralatan di atas kami nyatakan **MEMENUHI PERSYARATAN K3** dengan Nomor Seri : **25350903**, Pabrik Pembuat : **Cummins India Limited**., Negara Pembuat : **India**, Tahun Pembuat : **2010**, Kapasitas : **1.256 kVA** untuk di pergunakan di **Area Gedung PT PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRES – Ruang Genset (PDG JB 01)**, dengan tetap mentaati norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

VII. SARAN

1. Motor diesel harus dioperasikan oleh Operator yang telah memiliki Lisensi Operator dari Kemnaker RI
2. Segera pasang lampu penerangan yang mati sebanyak 2 pcs
3. Lakukan pemeriksaan dan perawatan rutin pada unit secara berkala
4. Lakukan pemeriksaan dan pengujian berkala paling lambat tanggal **14 Agustus 2027** sesuai dengan **PER.38/MEN/2016.**

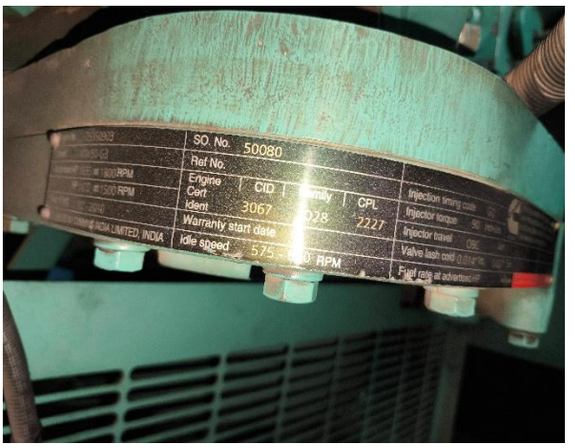
Jakarta, 18 Agustus 2026
Yang Memeriksa dan Menguji,
Ahli K3 Pesawat Tenaga dan Produksi



Heru Dwi Cahyono
5/0098220426/AS.01.04/IV/2026

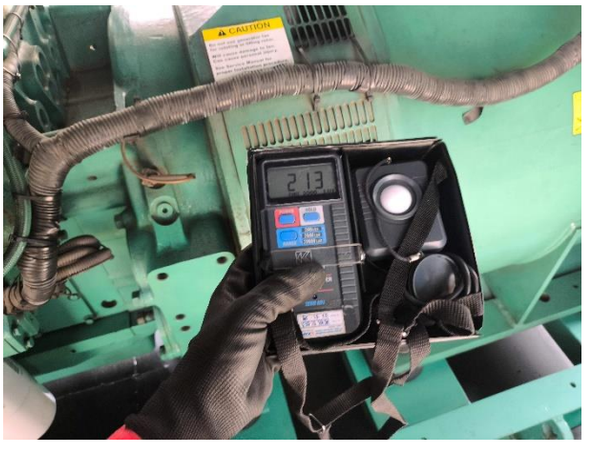
VIII. DOKUMENTASI

Tampak Keseluruhan Unit	Tampak Kontrol Generator
	
Tombol Kontrol	**E- Stop**
	
Tampak Generator	**Nameplate Generator**
	

Mesin	Nameplate Mesin
	
Filter Bahan Bakar	**Muffler**
	
Cerobong Asap	**Infrared Window**
	

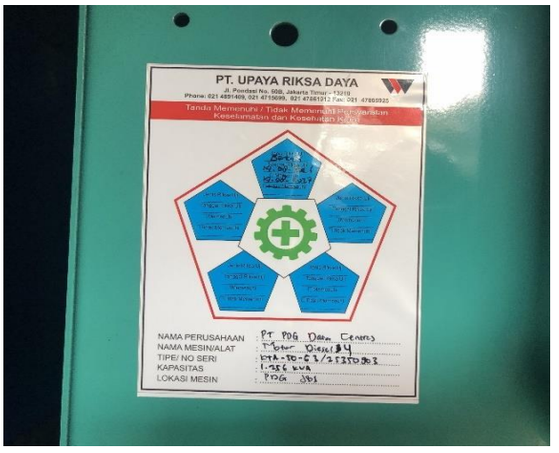
PT. UPAYA RIKSA DAYA

Jl. Pondasi No. 50 B, Kampung Ambon, Jakarta Timur. 13210

Proses Pengukuran Kebisingan	Hasil Pengukuran Kebisingan
	
Proses Pengukuran Pencahayaan	**Hasil Pengukuran Pencahayaan**
	
Proses Pengukuran Grounding	**Hasil Pengukuran Grounding**
	

PT. UPAYA RIKSA DAYA

Jl. Pondasi No. 50 B, Kampung Ambon, Jakarta Timur. 13210

APAR	Stiker Riksa Uji
	

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : http://www.naker.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/1312 /AS.01.02/XI/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi, syarat teknis, dan laporan kegiatan laporan kegiatan PT Upaya Riksa Daya oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga Produksi;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari PT Upaya Riksa Daya Nomor : 038/URD/X/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor 5/14543/AS.02.00/XI/2021 a.n Agus Supriyanto;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2310230099041;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 19011965;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 13210.20241030.0001, tanggal 30 Oktober 2024;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 76.651.453.3-003.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan	: **PT UPAYA RIKSA DAYA**
Alamat	: Jl. Pondasi No. 50B, Kampung Ambon, Jakarta Timur
Penanggung Jawab	: Mudjachid Machmud
Tenaga Ahli	: Agus Supriyanto
Bidang Kegiatan	: Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi

KEDUA : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2024
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Hery Sutanto, S.T., M.M.
19710922 199703 1 002

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/0098220426/AS.01.04/IV/2026
TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Heru Dwi Cahyono, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari PT UPAYA RIKSA PATRA Nomor 0874/ADMURP/II/2026 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

2. Pertimbangan Tim Penilai Evaluasi Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi kepada :

Nama	: **Heru Dwi Cahyono**
Tempat, Tanggal Lahir	: Kudus, 24 September 1995
Perusahaan	: **PT Upaya Riksa Daya**
Alamat	: JI. Pondasi Raya No. 50B, Kampung Ambon, Jakarta Timur

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 April 2026

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Ir. Ismail Pakaya, M.E
NIP. 19680113 199303 1 005

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syeh KH. Nawawi Al Bantani
Telp (0254) 267111 Fax. (0254) 267112 Kota Serang 42171

SURAT KETERANGAN

No : 566/ 2832 -DTKT/K3-PTP/IX/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh PJK3 - PT. Citra Media Sarana, pada tanggal 1 September 2025 terhadap Pesawat Tenaga dan Produksi, diterangkan bahwa:

A. Data Umum Objek Pengujian

1. Jenis Obyek K3 yang diuji	: Motor Diesel 4
2. Nama Perusahaan	: **PT. PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRES**
3. Alamat Perusahaan	: Menara Astra 37th Floor Jalan Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 Indonesia
4. Lokasi Penggunaan	: Gedung PT. PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRES BINTARO, Jalan HR Rasuna Said Sektor 7 Kav 6-7 Bintaro, Tangerang Selatan

B. Data Teknis Objek Pengujian

1. Type/ Model Engine	: KTA-50-G3
2. Pabrik Pembuat	: CUMMINS INDIA LIMITED
3. Tempat/ Tahun Pembuatan	: India/ 2010
4. Nomor Serie	: 25350903
5. Tenaga Mula (Starter)	: Accu
6. Klasifikasi	: Stasioner
7. Kapasitas Daya	: 1.256 KVA

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan / atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya (paling lambat 1 September 2026), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serang, 22 September 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Banten

SEPTO KALNADI
NIP. 19680916 198903 1 010

Yang Melakukan Evaluasi
Pengawas Ketenagakerjaan

MUSTAHAL
NIP. 19680109 199103 1 006

Catatan: Pengurusan dokumen Surat Keterangan ini tidak dipungut biaya
